

BSN

شريك الأعمال

رحلة تطوير المنصة الرقمية

اللي خالصناه • اللي هنعمله • الخريطة الكاملة

6

مراحل خلصت

5

مراحل جاية

60

spec صفحة

200+

ملف كود

اللي هنغطيه النهارده

المراحل المنجزة ✓

(ما تم بناؤه فعلياً • DONE)

1. Laravel + React + Auth — الأساس التقني ●
2. Admin/Dev/User الثلاثة Dashboards الـ ●
3. تكامل المدفوعات — 5 بوابات ●
4. Laravel Reverb — الفوري Chat الـ ●
5. الهوية البصرية للموقع العام. ●
6. Master Spec + Case Study الـ ●

المراحل القادمة →

(ما هو مخطط للتنفيذ • NEXT)

1. Migrations + Models — تأسيس البيانات ●
2. Order مسار الـ — Path A (Packages) ●
3. Quote مسار الـ — Path B (Custom) ●
4. Admin CMS لوحة الـ ●
5. Launch + النهائي Polish الـ ●

من وكالة → لمنصة رقمية

متكاملة بتخدم العملاء بشكل فوري وشفاف self-service التقليدي إلى منصة agency من نموذج الـ BSN التحوّل الاستراتيجي اللي بنبنيه على مدار شهور — نقل

BEFORE · 2025

Agency Model

📞 scattered (WhatsApp + Email) تواصل

⌚ عرض سعر يأخذ 3-7 أيام

✗ للعميل portal مفيش

💳 دفع تحويل بنكي يدوي

📈 مشاريع / شهر 3-4

🔄 كاغد + Excel إدارة من

AFTER · 2026

Platform Model

💬 chat real-time كامل بـ Portal

⚡ خلال 24 ساعة Path B · فوري Path A

📊 Tracking + deliverables لكل مرحلة

🏦 5 بوابات دفع محلية

🚀 مشروع / شهر مستهدف 25-30

🤖 KPIs ذكي بـ admin dashboard

PART

01

اللي خالصناه

✓ DONE

مراحل أساسية تم إنجازها — تشكّل أساس صلب جاهز للبناء فوقه. من البنية التحتية التقنية 6 للهوية البصرية الكاملة، وأخيراً المرجع الاستراتيجي الشامل

PHASE 01

01

مكتمل ✓

التقدير:
أسابيع 3

الأساس التقني

بنية المشروع التقنية الأساسية • Foundation



Laravel 11 API

Backend بـ Sanctum + queues
+ scheduling



React 18 SPA

Frontend بـ Vite + Tailwind +
React Query



Auth + Roles

Login, Register, Forgot/Reset
Password



Database Schema

Users · Projects · Tasks ·
Deliverables · Payments



Models + Migrations

13 model مع كل العلاقات والـ
soft deletes



API Versioning

/api/v1/* بـ fallback hints +
audit logs

02

مكتمل ✓

التقدير:
أسبوع 2

الـ ثلاثة Dashboards

صلاحيات مختلفة لكل دور • Role-Based Access

ADMIN

لوحة الأدمن

- إدارة المستخدمين
- كل المشاريع والمدفوعات
- Filament panel
- Audit Logs
- Reports + KPIs

DEVELOPER

لوحة المطور

- المشاريع المعيّنة له
- Kanban tasks
- deliverables رفع الـ
- chat مع العميل
- Time tracking

CLIENT

لوحة العميل

- مشاريعي وتقدّمها
- الفواتير والمدفوعات
- (chat) الرسائل
- deliverables تحميل الـ
- الملف الشخصي

03

مكتمل ✓

التقدير:
أسبوع 2

تكامل المدفوعات

بوابات دفع محلية 5 • Strategy Pattern

Paymob Card

Visa · Mastercard · iframe checkout

Paymob Wallet

Vodafone Cash · Orange · WE Pay

Paymob Installments

valU · Souhoola · Forsa

Fawry

Cash collection · 30K+ outlet

Kashier

Saudi/Egypt · hosted page

✓ Webhooks · ✓ HMAC verification · ✓ Refund support · ✓ Invoice auto-generation

04

مكتمل ✓

التقدير:
أيام 10

الفوري Chat الـ

Laravel Reverb · WebSocket Real-Time

100ms الرسائل الجديدة

فوري WebSocket push

ثانية 30 rooms قائمة الـ

Polling لـ unread counts

Typing indicator 2s
debounce

+ 5s safety timeout

Mark as read فوري

عند الفتح أو وصول رسالة

scaling تحكم كامل في الـ · Pusher توفير \$99-499/شهر من · (fees مفيش) Self-hosted :الفوائد

PHASE 05

05

مكتمل ✓

التقدير:
أسبوع 2

الهوية البصرية

Brutalist Design · 8 صفحات عامة + Design System كامل

Purple

#5C15CC

Orange

#F15A24

Teal

#65C8D0

Ink

#0F0830

الصفحات التي اتبنت

Home

Services

ServiceDetail (x4)

Pricing

Portfolio (41)

About

Contact

PublicLayout

Cairo · Tajawal · Archivo Black · Space Mono · RTL Arabic · 3,260 CSS lines

06

مكتمل ✓

التقدير:
أيام 5

الـ Master Spec

صفحة 14 · قسم 0 · مرجع استراتيجي شامل 60



User Personas (×4)

محمد · نورة · سارة · عمر



User Journey Map

Path A + 6 مراحل لـ 9



User Flows (×4)

Path A · Path B · Onboarding · Payment



DB Schema

جديدة بالتفصيل 10 migrations

API Endpoints
(20+)

Public + User + Admin

8 Low-Fi
Wireframes

الشاشات الأساسية الجديدة

Competitive
Analysis

3 موديلات + positioning map



Case Study (11 فصل)

قصة المشروع كاملة

★ كامل ومحضر للتنفيذ Claude Code Prompt

Claude Code جاهز للنسخ ولصقه في 5 phases + acceptance criteria برومبت احترافي بـ

اللي خلصناه — الإجمالي

الحالي — في حدود 8 أسابيع شغل مركّز MVP بناء كامل من الصفر للـ

6

مراحل خلصت
Foundation → Spec

200+

ملف كود
Backend + Frontend

8

صفحات عامة
brutalist style كاملة بـ

5

بوابات دفع
Paymob • Fawry • Kashier

3

Dashboards
Admin • Dev • Client

60

spec صفحة
PDF + HTML + Case Study

10+

templates إيميل
Welcome • Receipt • Reminder

10+

Notifications
in-app + email

PART

02

اللي هنعمله

→ NEXT PHASES

من تأسيس البيانات لإطلاق المنصة — *business workflow* مراحل قادمة تكمل الـ 5
بشكل كامل. التقدير الإجمالي: 20-28 يوم عمل (4-6 أسابيع لمطور متفرغ)

NEXT PHASE

01

مخطط

المدة:
4-5 أيام



تأسيس البيانات

Database Foundation

الجديد business workflow التي تحتاجها الـ seeders والـ models والمigrations إضافة الـ

10 Migrations جديدة



package_addons · bundles · coupons · orders ·
leads · quotes

9 Models بالعلاقات



relationships والـ factories مع الـ

Seeders كاملة



add-on + 4 bundles + 4 coupons باقة + 13 20

Email Verification



Token-based + resend endpoint

NEXT PHASE

02

مخطط

المدة:
أيام 5-7



Order مسار الـ

Path A · Package Purchase Flow

الأساسي workflow الذكي الذي يخلي العميل يطلب باقة جاهزة ويدفع في 5 دقائق — الـ wizard

5-Step Wizard



service → package → addons → details → checkout

OrderController + APIs



draft · calculate · checkout · attachments

Live Calculation



السعر يتحدّث فوراً عند أي تغيير

Coupon + Checkout



payment gateways تكامل كامل مع الـ 5

03

مخطط

المدة:
أيام 5-7



Quote مسار الـ

Path B · Custom Project Workflow

يبني عرض سعر مفصل + العميل يقبل/يتفاوض/يرفض Smart Q&A wizard + admin — للمشاريع المعقدة

Smart Q&A Wizard



أسئلة ذكية حسب نوع الخدمة

Admin Quote Builder



line items + payment schedule + validity

Accept/Reject/Negotiate



للتفاوض chat + خيارات للعميل 3

Quote → Order




تلقائي عند القبول Conversion

NEXT PHASE

04

مخطط

المدة:
أيام 3-5



Admin لوحة الـ

Admin CMS + Management

orders dashboard + leads والـ orders مراقبة الـ + packages, addons, bundles, coupons إدارة كاملة للـ

Addons + Bundles CRUD



إضافة/تعديل/حذف الإضافات والحزم

Coupons Management



usage tracking وlimits مع

Orders Management



تتبع الحالة • developer تعيين

Enhanced KPIs Dashboard



revenue • leads • top packages • trends

NEXT PHASE

05

مخطط

المدة:
أيام 3-4



النهائي Polish

Launch Preparation

emails + legal pages + tests + documentation + soft launch — تجهيز كل اللي لازم قبل الإطلاق

Email Templates



Order confirmation · Quote received · etc

Legal Pages



Terms · Privacy · Refund Policy

Test Coverage



الجديدة flows للـ PHPUnit tests

Soft Launch




عميل ودود لـ 2 أسابيع قبل الإطلاق الرسمي 20

TIMELINE

الخط الزمني للـ 5 مراحل القادمة

بالتوازي devs يوم عمل · 4-6 أسابيع لمطور متفرغ · 3-4 أسابيع لـ 20-28

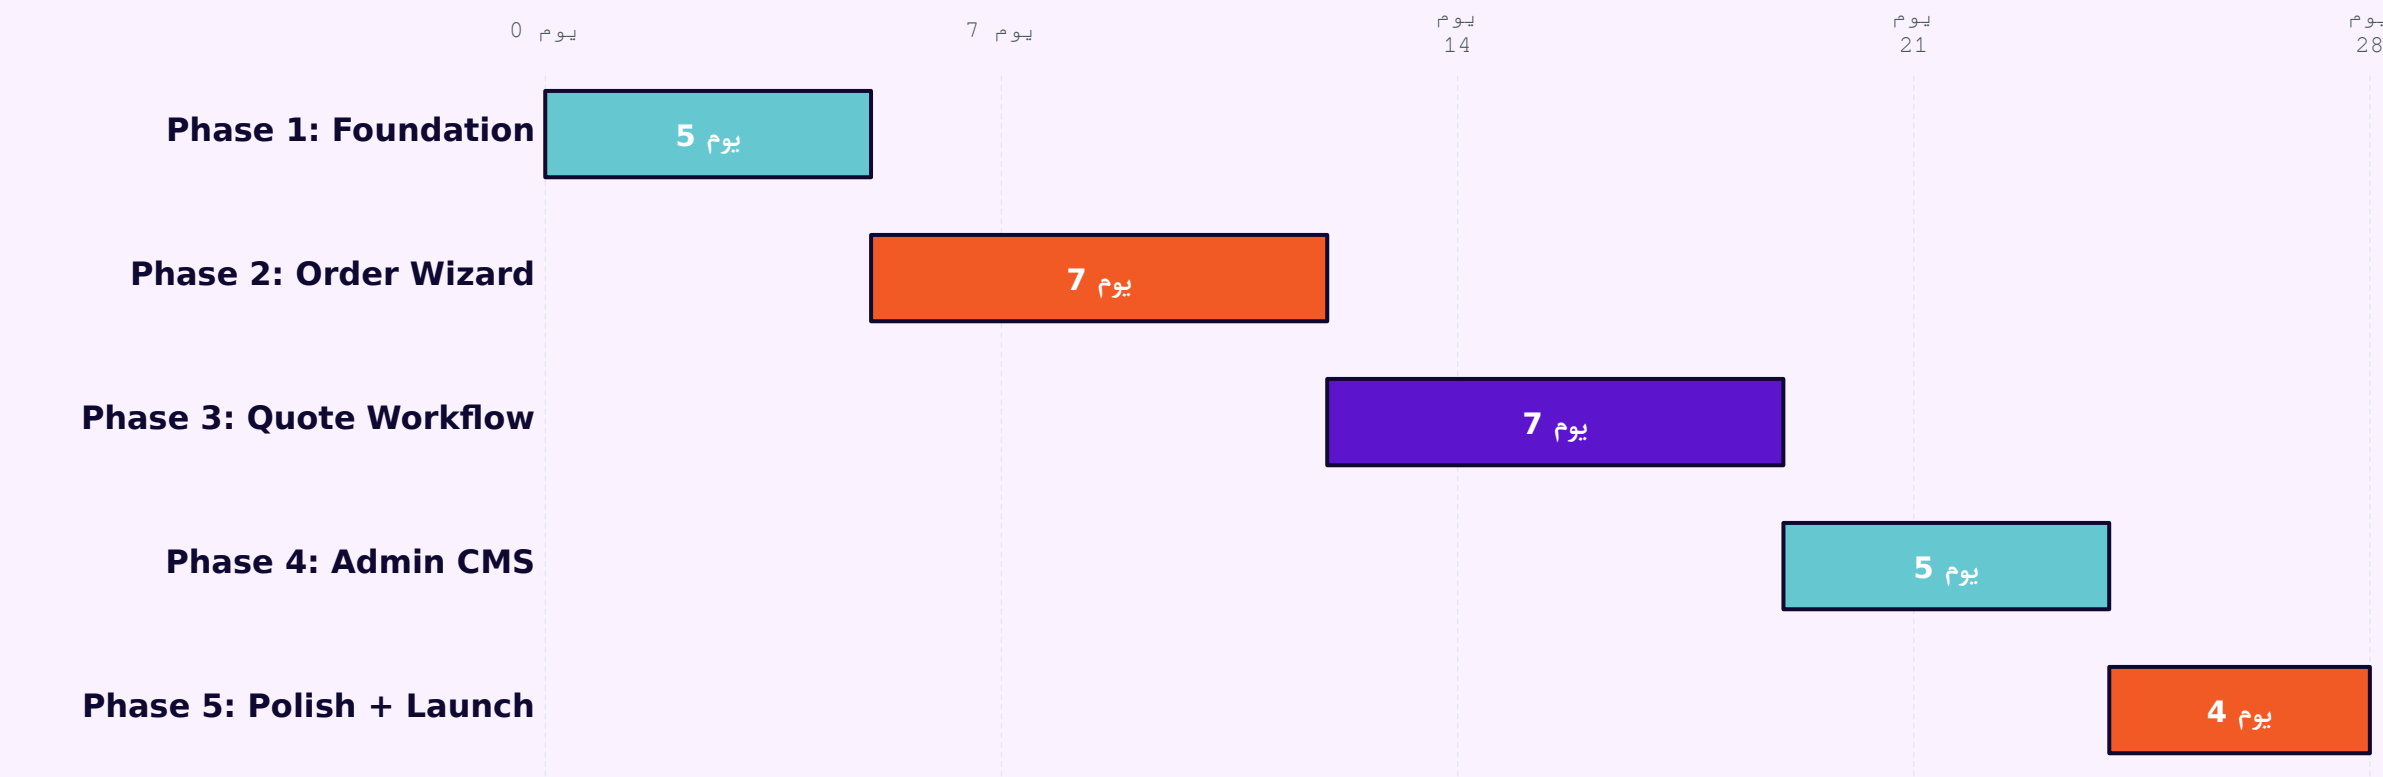

بنهاية يونيو Launch 2026 يوم عمل · إذا بدأنا الأسبوع الجاي → جاهز للـ ~28 Phase 5: لـ Phase 1 من 17 July

المستهدفة بعد الإطلاق KPIs الـ

productization و self-service التحوّل من معدّل 3-4 مشاريع/شهر لـ 25-30 مشروع/شهر خلال 12 شهر — مدعوّمًا بـ

المؤشّر	قبل	بعد 6 شهور	بعد 12 شهر	التحسّن
المشاريع شهرياً	3-4	12-15	25-30	+750%
وقت من طلب لموافقة	أيام 3-7	<24h	<4h	-95%
Self-Service نسبة	0%	50%	75%	جديد
Avg Order Value (EGP)	25,000	22,000	28,000	+12%
MRR Marketing (EGP)	15K	50K	120K	+700%
Conversion Rate	~2%	5-7%	8-10%	+400%

NEXT IMMEDIATE STEPS

الخطوات الفورية

الأسبوع الجاي Phase 1 اللي محتاج تختاره عشان نبدأ

A

فوراً Phase 1 ابدأ

migrations + 9 models +
seeders + email verification
الـ 10

أيام 4-5

B

Soft Launch Plan اعمل

support حدد 20 عميل ودود · بريف الفريق · حضر
workflows

أيام 2-3

C

Merchant Accounts نظم

Paymob + Fawry production · KYC docs ·
webhook URLs

أسابيع 1-2

اختار حرف واحد من اللي فوق وقولّي → نبدأ تنفيذه فوراً

BSN

شريك الأعمال

من وكالة → لمنصة

شكراً
